



經濟部水利署第六河川局
Sixth River Management Office, WRA, MOEA

曾文溪排水分洪箱涵
上游 7k+820~8k+420 護岸
新建工程併辦土石標售
(111-B-00201-001-003)

112 年 01 月份
生態保育措施自主檢查表

承攬廠商:岡山營造有限公司

生態保育措施自主檢查表

曾文溪排水分洪箱涵上游 7K+820~8K+420 護岸新建工程併
辦土石標售

表號：6
 施工進度： %

檢查日期：112 / 1 / 20
 預定完工日期：112 / 9 / 12

項次	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況 陳述
			非執行 期間	已執行/ 執行中	執行 不完整	未 執行	
生態 保全 對象	1	座標 X：120.179982、Y：23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。		✓			魚木斷根至今無異常，預計於魚木落葉後移植
	2	工區內有 3 顆樟樹、13 顆茄苳，移植至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業			✓		茄苳已移植完成，樟樹補植地尚未確認，尚未補植
生態 友善 措施	3	完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草籽。	✓				
	4	堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢	✓				
	5	左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田	✓				
	6	河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。		✓			已篩出原有塊石皆已集中堆置保留。

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

現場檢查人員：陳靖雯 1/20

工地負責人：陳明丞 1/20

1.座標 X：120.179982、Y:23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。

[示意圖]



[施工中]



日期:

說明:

日期:112.01.31

說明:魚木現況

2.工區內有 3 顆樟樹、13 顆茄苳，移植至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業

[示意圖]



[施工中]



日期:


說明:

日期:112.01.31

說明:茄苳樹為另案工程，已於 8 月後旬移植至附近水月公園；樟樹斷根後，1 株枯死、1 株遭颱風吹倒、1 株因整地不慎移除，現擬向園藝公司購買喬木補植，俟移植地點確定後進行補植。

3.完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草仔

[設計圖]

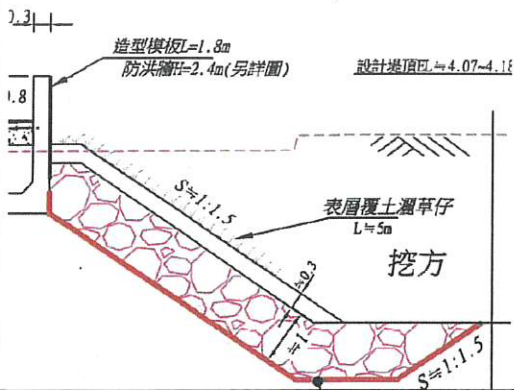


[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作

4. 堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢

[設計圖]

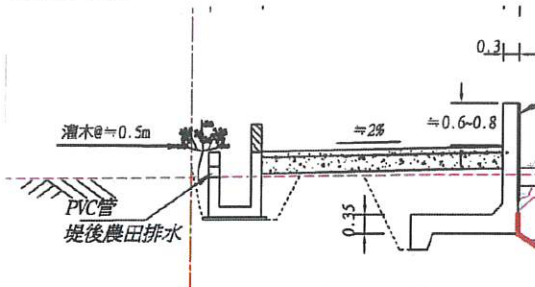


[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作

5. 左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田

[設計圖]

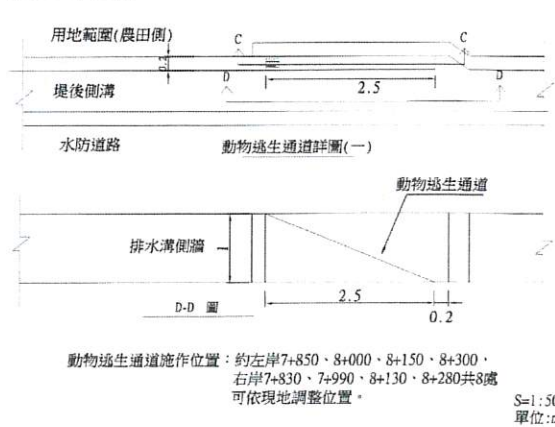

[施工中]

日期:
說明: 尚未施作

日期:
說明: 尚未施作


6. 河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。

[施工前]



日期:
說明: 尚未施作

[施工中]

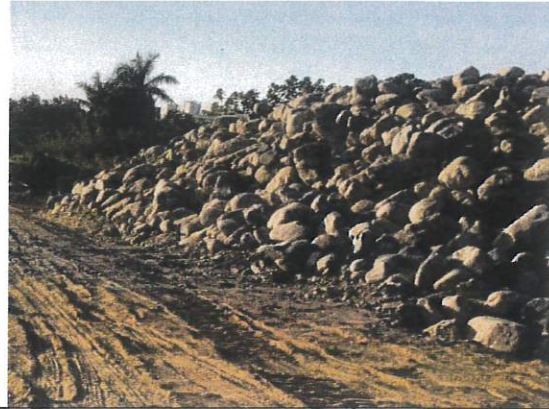


日期:112.01.31
說明:已用施工機具裝設格柵斗篩
出河床原有之塊石，並將其集中
堆置於暫置區予以保留。

公共工程施工中營造業生態專業人員檢查紀錄表

編號：05





一、工程名稱	曾文溪排水分洪箱涵上游 7K+820~8K+420 護岸新建工程併辦土石標售					
二、工程主辦機關	經濟部水利署第六河川局					
三、承攬廠商	岡山營造有限公司					
四、填表日期	2023/1/13					
五、工程進度概述	1. 右岸 8K+100~255、295~360、360~500 防洪牆基礎、牆身，灑水養護	預定進度	19.68%			
	2. 右岸 8K+140~255 防洪牆牆身，模板組立	實際進度	47.91%			
	3. 右岸拋塊石					
六、檢查生態保育措施執行情形	檢查項目	勘查結果		辦理情形	備註	
		合格	不合格			
	(一)座標 X：120.179982、Y:23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。	V				等待枯葉後再進行移植，提高樹木存活率。
	(二)補植 3 棵樟樹至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業	—	—			
	(三)完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草籽。	—	—			
	(四)堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢	—	—			
	(五)左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田	V			左、右岸各 4 座已預留位置，通道斜面未施作	
(六)河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。	—	—			原保留塊石已拋放護岸基腳，部分區段(依設計圖)，以外購塊石佈置於渠底	
七、發生施工中環境生態異常之原因分析、解決施工技術問題概況	未發生施工中環境生態異常情形。					
八、施工中發現有生態保育實際需求或遇環境生態異常需調整生態保育措施之情形						
九、其他依法令及契	施工廠商填查 1 月份生態保育措施自主檢查表於春節過後填寫完畢，					

約約定生態專業人員 應辦事項辦理情形 (如檢查生態保育措 施自主檢查表等)	另行檢閱。
十、生態專業人員簽章： 國立臺南大學流域生態環境保育研究中心專案經理陳佳郁 	

註：

1. 本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2. 本表填報時機如下：(1) 生態專業人員依經濟部水利署工程廠商施工階段生態檢核作業補充說明 第四點第 9 項規定參與生態保育措施執行情形檢查時。(2) 各機關於契約中約定。
3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

影像拍攝日期：2023/1/11

		
生態保全對象：魚木	施工便道位於河道中，土石未 落入溪水致濁度上升	右岸動物通道預留位置
		
溪水導流至左岸，未受工程阻 斷	施工終點	水月公園移植樹木(茄冬 12 株)
