

【基本資料表】

● 整體計畫名稱：	內惟埤生態園區水環境營造計畫		
● 核定分項案件名稱：	曹公圳新舊水域串聯與環境減壓計畫	● 核定批次：	第二批次
● 核定經費	中央補助經費	地方自籌經費	合計
(千元)	70,000	19,744	89,744
● 工程預算金額	陸域工程：新台幣 45,237,656 元 水域工程：新台幣 36,000,000 元		
● 工程決標金額	陸域工程：新台幣 35,740,000 元 水域工程：新台幣 35,920,000 元		
● 工作項目：	陸域工程：環湖自行車道、噴泉廣場、館前廣場入口門戶與親水空間改造工程、照明工程及植栽工程。 水域工程：引水道工程、清水循環系統工程、清水放流管工程、池區拷潭工程及閘門工程		
● 施工期程	陸域工程：開工：108年3月18日、完工：109年6月1日 水域工程：開工：108年11月15日、完工：109年7月16日		
● 工程位置座標	(緯度, 經度)：(22.658203, 120.285013)		
● 計畫效益	親水遊憩效益 受益人數：1年 約 80 萬人	營造親水空間：約 3 公頃	其他：(如增加就業機會人數、產業投資、環境教育、水質改善(量化)..等)

【願景圖】(2 幅)



【施工前】



圖 1



圖 2



圖 3



圖 4



【施工中】



圖 1

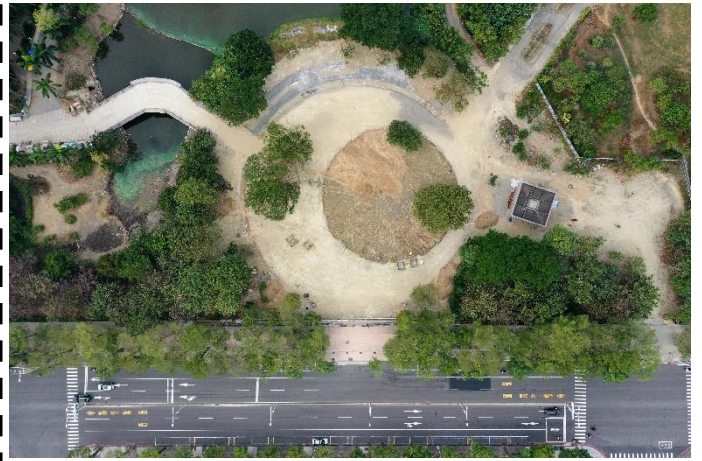


圖 2



圖 3



圖 4



【完工】



圖 1



圖 2



圖 3



圖 4
