

嘉139線5K+100~9K+925及銜接台18連絡道拓寬工程

生態保育措施自主檢查表

表號：01 檢查日期：按一下或點選以輸入日期。

施工進度：nn.nn% 預定完工日期：2024/4/30

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	保全赤蘭二號橋上游側左岸橋旁兩棵山黃麻。					
	2.	保全龍潭橋旁小山丘及檬果樹數棵。					
生態保育措施	3.	橋梁改建之水域不斷流並避免濁度提高。					
	4.	施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。					
	5.	明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。					
	6.	施工人員或機具產生之污廢水，均應妥善處理，勿在未經處置下排入周遭水體。					
	7.	工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。					

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：旭鋒營造有限公司/助理工程師 姓名(簽章)：_____

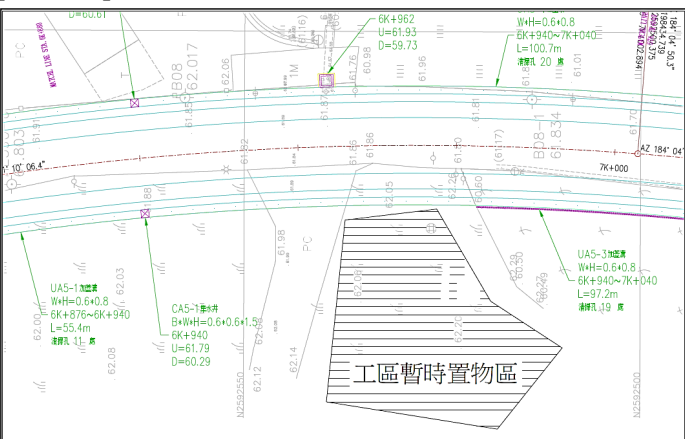
監造單位

單位/職稱：台灣世曦工程顧問股份有限公司/監造 姓名(簽章)：_____

生態檢核施工階段照片及說明

1.保全赤蘭二號橋上游側左岸橋旁兩棵山黃麻	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工中]</p>
<p>日期：2022/7/18生態團隊拍攝 說明：兩棵山黃麻位於赤蘭二號橋上游側左岸之橋旁處，應予以明確圈圍、保全不擾動。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
2.保全龍潭橋旁小山丘及椽果樹數棵。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工中]</p>
<p>日期：2022/7/18生態團隊拍攝 說明：保全龍潭橋旁小山丘及其上椽果樹數棵並針對臨路的植株進行植栽保護(如黑網包覆基部)。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
3.橋梁改建之水域不斷流並避免濁度提高。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工中]</p>
<p>日期：2022/7/18生態團隊拍攝 說明：相關溪流水域不斷流並避免因施工而濁度提高。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：。</p>

4. 施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。

<p>[施工前]</p>  <p>Technical drawing showing a temporary storage area (工區暫時置物區) and various engineering details like curves and elevations. The drawing includes stationing (e.g., 6K+962, 6K+940), curve data (e.g., WH=0.6+0.8, L=100.7m), and a title block at the bottom with project information from the Jiyang County Government.</p>	<p>[施工中]</p>
--	---------------------

<p>日期：2022/8/9 生態團隊節錄自設計圖中 說明：相關區域規劃標示於施工計畫中。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
---	--------------------------------------

5. 明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。

<p>[施工前]</p>	<p>依現地狀況拍攝</p>
---------------------	----------------

<p>日期：按一下或點選以輸入日期。生態團隊拍攝 說明：明確標示、圈圍工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動，亦提升用路人安全。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
---	--------------------------------------

(若有新增其他生態保育措施，可自行於下方右欄附上佐證照片)

<p>新增保育措施項目：(自行填寫內容)</p>	<p>[施工中]</p>
--------------------------	---------------------

	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
--	--------------------------------------

(小尺度生態關注區域圖)

嘉139線5K+100~9K+925及銜接台18連絡道拓寬工程-生態關注區域圖



※本圖取自規劃設計階段報告之小尺度生態關注區域圖。

生態自主檢查表填表需知

- 1.主辦機關於施工階段督責廠商定期填具本生態自主檢查表，納入品管檢核作業。
- 2.本表於施工期間定期由施工廠商填寫，監造單位查驗。請依編號檢查生態保全對象及生態友善措施勾選紀錄，並附上能呈現執行成果之資料或照片。
- 3.檢查生態保全對象時，須同時注意所有圍籬、標示或掛牌完好無缺，可清楚辨認。
- 4.如發現損傷、斷裂、搬移或死亡等異常狀況，請第一時間通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊。
- 5.工程設計或施工有任何變更可能影響或損及生態保全對象或友善措施，應通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊溝通協調。
- 6.表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生態評估人員或工程主辦單位研議修正。
- 7.請依各項生態保全對象保育措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，需完整呈現執行範圍及內容，儘量由同一位置與角度拍攝。
- 8.表格欄位不足可自行增加。
