

128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程

施工階段生態檢核生態保育措施自主檢查表

工程名稱	128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程		
承攬廠商	荃威營造有限公司		
工程位置	全工區	檢查日期	113 年 11 月 17 日
檢查結果	○檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
減輕路殺保護 野生動物。	1. 4K+200~4K+350 鄰近住宅，車流量多，需設置反光板、防護網。	已設置動物防護網	○
	2. 4K+424 鄰近溪邊，評估易有石虎穿越道路，需設置動物通道。	已埋設完成	○
避免遊蕩動物 聚集於工區附近。	3. 落實廚餘不落地，密封後帶走處理以免吸引遊蕩動物。	廚餘密封後棄置於 垃圾桶內並加蓋	○
減輕施工干擾	4. 營建材料集中堆放於通霄鎮內湖東段 246 地號。	符合	
	5. 採用低噪音工法施工。施工期間需遵守「噪音管制標準」進行噪音管制。	—	—
	6. 具有粉塵逸散性之建材、廢棄物等需鋪蓋防塵網或噴植草籽並以稻草席覆蓋地表，遵守「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」。	—	—
	7. 施工車輛進出工區時需進行清洗，施工車輛行經路線每日進行灑水，減少揚塵產生。	符合	○
	8. 運輸車輛需具備密閉車斗或防塵布，避免土石掉落馬路。	符合	○
	9. 石虎等夜行性野生動物傍晚開始活動，工程車輛夜間停止施工，迴避夜間動物活動時間。	未於夜間施工	○
	10. 施工車輛動線鋪設碎石或砂石。	—	—
增加樹木移植 存活率	11. 選擇適合季節移植路樹。	—	—
異常狀況複查結果：			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：			

施工廠商

工地主任：鍾劭一

生態廠商

單位職稱：涂祐嘉

監造單位：荃威營造有限公司計畫專員

單位職稱：曠昇工程顧問企業股份有限公司



檢查人員：羅祐怡

姓名(簽章)：

姓名(簽章)：羅期文

自主檢查照片


工程名稱：128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)
拓寬工程



運送土方車輛，以防塵網覆蓋



設置動物防護網

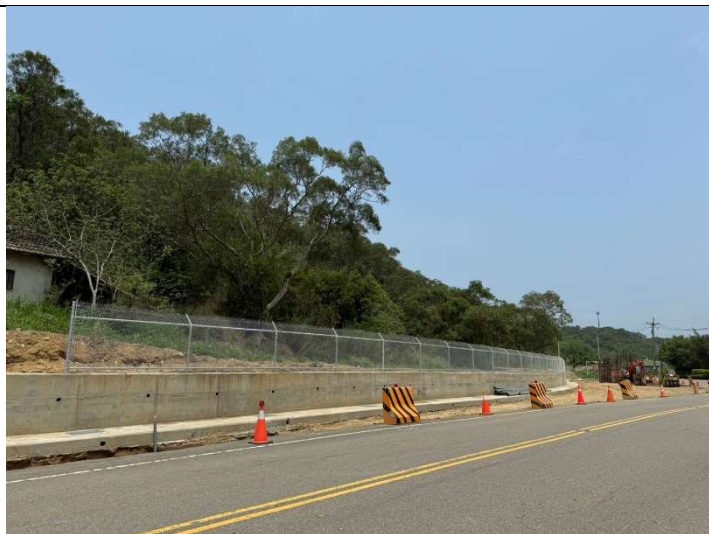

設置動物防護網
