


主辦機關	新北市政府	
工程名稱	基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯	
承攬廠商	中華威霸營造有限公司	
工程位點	地點：新北市汐止區 TWD97 座標 X：318355 Y：2775415	

編號	項目	檢查標準	檢查日期				
			109.10.28	109.11.23	109.12.27		
1	水域環境	[迴避]施工時應避免土石、人為垃圾落入河中，避免破壞生物棲地。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	施工便道	[減輕]降低施工時產生之揚塵對周遭環境影響，建議對施工道路及車輛進行灑水來降低揚塵量。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	植被保全	[迴避]施工時應盡量縮小影響的範圍，盡量避免擾動濱溪帶與次生林。便道開闢時應盡量縮小量體。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4		[減輕]以小型機具方式施作，降低破壞面積。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	新植植栽	[補償]施工後進行原表土回填與噴灑草籽等補償措施以利植被回復。草籽請選擇在地的原生種，以避免影響原生生態系的平衡。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6		[補償]如需種植樹種也請選擇在地的原生種，並考量季節性，以避免影響當地生態環境。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8		[減輕]車道設置鄰近基隆河與次生林，且周邊地區有紀錄到水鳥與蛙類，故建議盡量降低噪音與震動，並避免晨昏(8 點前，17 點後)與夜間施工等，以減少對鳥類與兩棲類動物的干擾	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	野生動物保護	[減輕]於機具作業前進行草地干擾動作(如以竹竿或木棍撥草)以驅趕小動物。並注意輪下動靜，以免路殺。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10		[減輕]照明設施的設置除考量設施使用人員安全需求的必須性外，應盡量減輕對於野生動物的影響，例如避免過度或過亮的設置、燈泡熱源的隔絕等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11		[迴避]施工前以圍籬、插桿、警示帶等標示樹木與樹島，避免施工人員及機具誤入傷害。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	橫向連結性	[補償]因工區周圍用地為農業用地及濱水棲地，記錄上皆有兩棲類、蟹類、鳥類及爬蟲類。考量施作之自行車道恐將造成橫向棲地阻隔，需於自行車道底部以小型涵管方式增設生物通道。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否


異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	

備註：

- 一、本表於設計階段由設計單位依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。
 - 二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。
 - 三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。
- 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

承攬廠商(簽名)：


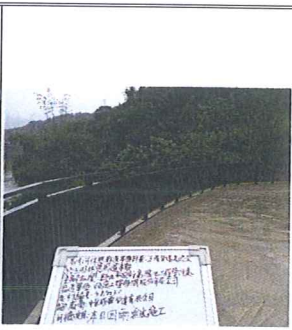





日期：

109.12.27

主辦機關	新北市政府			
工程名稱	基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯			
承攬廠商	中華威霸營造有限公司	填表人	傅昆寧	
工程位點	地點：新北市汐止區 TWD97 座標 X：318355 Y：2775415			

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				109.12.23	
1	施工中	埤塘滲流形成自然溼地應予以保護	有無迴避	■是□否： <u>埤塘未位於自行車道預定路線，且施工亦無破壞。</u>	
2	施工中	以最小擾動施工	有無執行	■是□否： <u>施工區域皆未超出自行車道預定範圍。</u>	
3	施工中	對施工度路及車輛進行灑水	每日灑水	□是□否： <u>施工中若有造成粉塵汙染，派灑水車灑水洗地面。</u>	
4	施工中	外側自然植物屏障不可破壞	有無迴避	■是□否： <u>兩側自然屏障皆無破壞。</u>	
5	完工	於施工擾動後之裸露地鋪設稻草蓆，並播撒原生或非入侵性草籽	有無鋪設與植栽	■是□否： <u>目前仍為施工中，將於自行車道完成後執行。</u>	
6	施工中	施工期間迴避河畔與埤塘兩區域螢火蟲棲息環境	有無迴避	■是□否： <u>迴避河畔及埤塘。</u>	
7	施工中	於 8:00 至 17:00 時段施工	有無遵守	■是□否： <u>每日工作時間皆為 8:00-17:00。</u>	
8	施工中	機具作業前進行草地干擾動作以驅趕小動物	有無驅趕	■是□否： <u>作業前進行草地干擾。</u>	
9	施工中	照明設施的設置應盡量減輕對於野生動物的影響，例如避免過度或過亮的設置、燈泡熱源的隔絕等。	有無遵守	■是□否： <u>已辦理變更設計中。</u>	
10	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音。	有無設置	■是□否： <u>已設置圍籬。</u>	
11	施工中	須與自行車道底部以小型涵管方式增設生物通道。	有無設置	■是□否： <u>於本案變更設計中增加生物通道。</u>	
編號 1 紀錄照片		編號 2 紀錄照片		編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片

			
<p>編號 5 紀錄照片</p>	<p>編號 6 紀錄照片</p>	<p>編號 7 紀錄照片</p>	<p>編號 8 紀錄照片</p>
			
<p>編號 9 紀錄照片</p>	<p>編號 10 紀錄照片</p>	<p>編號 11 紀錄照片</p>	
	
