

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府水利局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號
承辦單位：水利局污水二科
承辦人：王俊翰
電話：07-7995678轉2104
傳真：07-7472806
電子信箱：wch00232@kcg.gov.tw

受文者：本局污水二科

發文日期：中華民國107年6月13日

發文字號：高市水污二字第10734086100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本局107年6月7日召開『「全國水環境計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-中崙國宅污水管線納管更新』中崙五路(中崙國小旁)管線抵觸現場會勘紀錄乙份，請查照。

說明：依據本局107年5月29日高市水污二字第10733493600號開會通知單辦理。

正本：台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處(特高壓)、台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處、台灣電力股份有限公司鳳山區營運處、三采工程顧問有限公司、振農水泥製品股份有限公司

副本：本局污水二科

代理局長 韓榮華

本案依分層負責規定授權業務主管判發

「全國水環境計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫
中崙國宅污水管線納管更新現勘會議紀錄

一、日期：107年06月07日(星期四)下午2時30分

二、會議地點：鳳山區中崙國小旁

三、主持人：陳股長俊宇

記錄：王俊翰

四、出席單位及人員：

五、各單位意見：

(一)台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處

107/6/5 謝先生通知無管線，故不派員參加 TEL:07-3572168

(二)台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處

現場提供圖資乙份

(三)台灣電力股份有限公司鳳山營運處

原則配合辦理，該處管路須重新配置，計畫將原本管底深度自-1.95m(地面起算)提升至-1.6m，另依規定於每月僅能停電施工乙次，依該管路配置估算需停電4-5次，屆時停電恐致民怨，請承商協助溝通當地里民，俾利施工順遂。

(四)振農水泥製品股份有限公司

管線單位如須在現地勘查確認者，請先與監造單位及承攬廠商聯繫約定時間地點，縮短管遷時程。

1、現場聯絡人：0982-091-054

2、工務所連絡電話：07-7658937

(五)三采工程顧問有限公司

管線單位如須在現地勘查確認者，請先與監造單位及承攬廠商聯繫約定時間地點，縮短管遷時程。

1、監造人員：0919-078-132

2、公司連絡電話：07-3131146

六、結論：

請台灣電力股份有限公司鳳山營運處配合辦理相關牴觸位置之管遷，將管線提高35公分。管遷所需費用，本局依規定負擔，因本案係屬前瞻基礎建設計畫，請於收到紀錄後，詳實核計管線所需經費後函知本局，俾利辦理補償費繳納相關事項，並請儘速辦理管線遷移事宜。

「全國水環境計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-中崙國宅污水管
線納管更新

中崙五路(中崙國小旁)管線抵觸現場會勘

主辦單位：水利局污水二科

時間	107年6月7日(星期四)下午2時30分		地點	中崙國小
主持人	陳股長俊宇		記錄	王俊翰
出席人員	單位	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		
		台灣電力股份有限公司 輸變電工程南區施工處	來電通知無管線經過 謝先生 07-3572168	
		台灣電力股份有限公司 高屏供電區營運處	饒宗龍 0939627558 提供圖資	
		台灣電力股份有限公司 鳳山營運處	李育宏 7410111#5118	
		三采工程顧問有限公司	李俊輝	
		振農水泥製品股份有限公司	謝進發 3555 0982091054	
		本局污水二科	王俊翰	

1
2
3
4





5
6

管線抵觸圖

民國107年5月24日

工程名稱	中崙國宅污水管線納管更新		
試挖地點	中崙五路-中崙國小牌旁	單位	cm

平面圖：

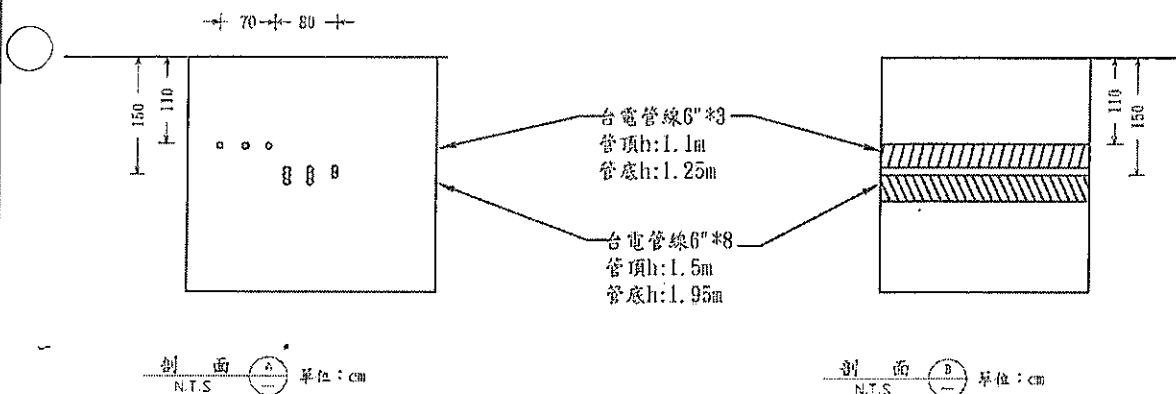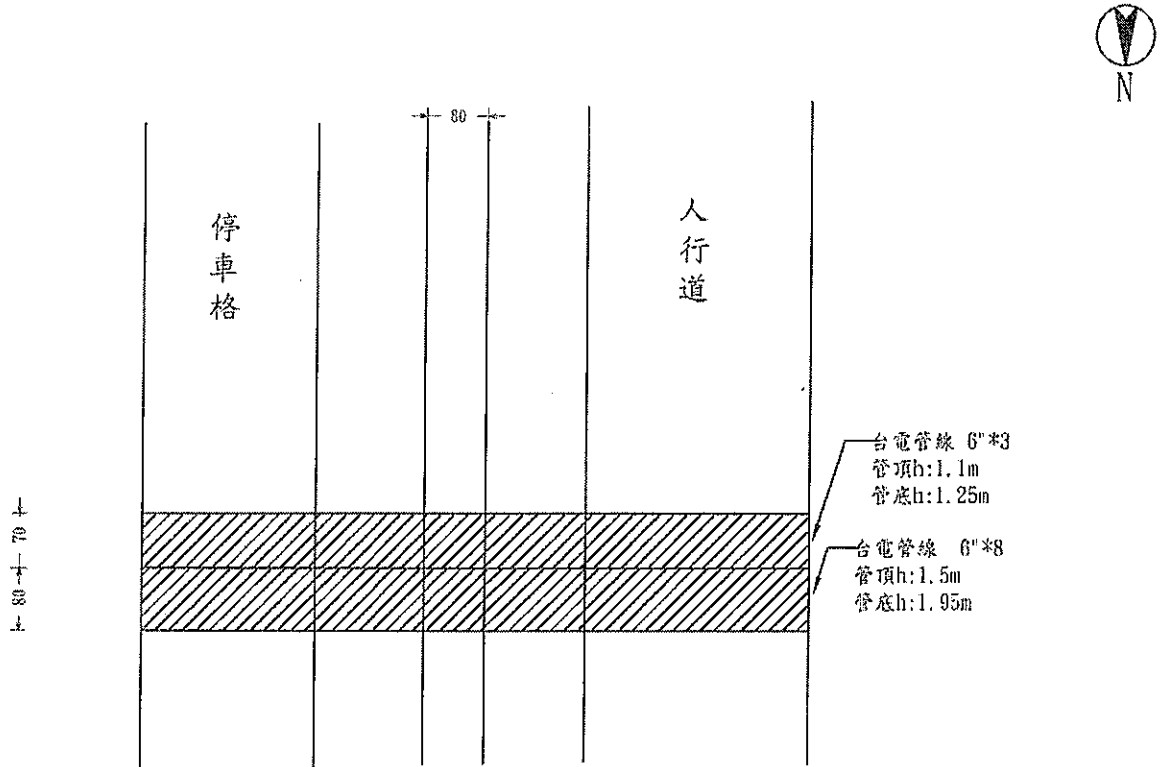

抵觸管線：
(1) 台電管線。

建議事項：
(1) 辦理管遷，請台電將管底高程-1.95m提高至-1.6m。



1
2
3
4



5
6
